みなべ町
橋梁個別施設計画

令和２年３月

みなべ町役場　建設課

目 次

１．　はじめに……1

１－１．背景　1

１－２．目的　2

２．　対象施設……2

３．　橋梁個別施設計画の基本方針……2

４．　健全度の評価……3

４－１．判定区分　3

４－２．判定区分の割合　4

５．　計画期間……4

５－１．計画期間　4

５－２．修繕等措置の着手状況　5

６．　対策の優先順位の考え方……5

７．　対策費用……6

更新履歴

令和３年 10 月　点検結果の反映と点検・修繕計画の見直し、および基本方針に事業の効率化や費用縮減のための取り組みを追記

令和４年　９月　点検結果の反映と点検・修繕計画の見直し、および費用縮減に文言の追記、判定区分の割合と修繕等の措置の着手状況を追記

令和６年３月　点検結果の反映と点検・修繕計画、判定区分の割合と修繕等の措置の着手状況の見直し

令和６年 12 月　点検結果の反映と点検・修繕計画、判定区分の割合と修繕等の措置の着手状況の見直し、基本方針に費用縮減のための具体的な数値目標を追記


令和７年９月　最新の点検結果の反映と点検・修繕計画、判定区分の割合と修繕等の措置の着手状況の見直し

令和８年９月　最新の点検結果の反映と点検・修繕計画、判定区分の割合と修繕等の措置の着手状況の見直し

１．　はじめに

１-１．背景


みなべ町が管理する橋梁数は、令和８年度 ８ 月末現在で３０９橋あります。このうち架設年が不明な橋梁が 183 橋あり、これらの橋梁の半数が架設後 50 年以上を経過していると仮定すれば、架設後 50 年以上経過した橋梁の割合は全体の７１％（219 橋）を占めており、20 年後の令和 28 年には 86%（263 橋）にさらに増加します。

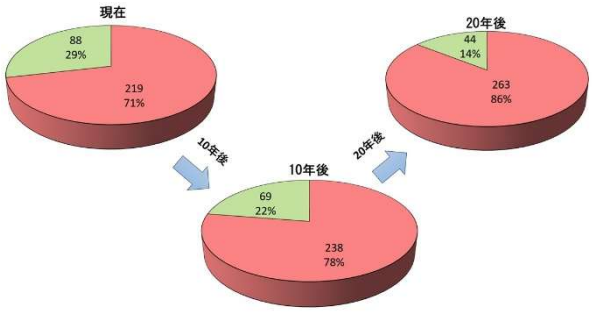

架設後 50 年超橋梁数の変化

こうした状況を踏まえ、老朽化を迎える橋梁群に対して、従来の対症療法型の維持管理を続けた場合、橋梁の修繕・架替えに要する費用が増大となることが懸念されます。コスト縮減するためには、従来の対症療法型から”損傷が大きくなる前に予防的な対策を行う”予防保全型への転換を図り、橋梁の寿命を延ばす必要があります。

そこでみなべ町では、将来的な財政負担の低減および道路交通の安全性の確保を図るために、令和 2 年度（2020 年度）から 50 年間のライフサイクルコストが最小となるように計画した「みなべ町橋梁個別施設計画」を策定し予防的修繕に取り組んでいます。

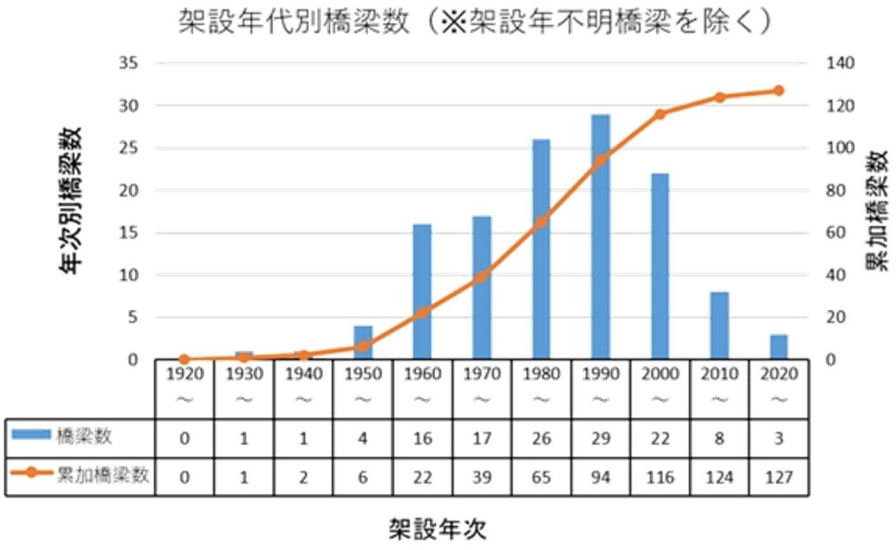

架設年度が不明な橋梁を除いた 127 橋で見ると、ピークは 1990 年代で、それ以前の１９５０年代から８０年代にかけての高度経済成長期を含んだ時期に全体の約 50%が建設されている。

１-２. 目的

従来の「対症療法型の維持管理」から、定期点検により橋梁の状態を把握し、点検結果に基づく早期補修を計画的に行う「予防保全型の維持管理」を実施することで、橋梁の長寿命化を図り、長期的な維持管理及び更新費用の縮減と平準化を図るとともに、道路ネットワークの安全性・信頼性の確保を図ることを目的とします。

２．　対象施設

「みなべ町橋梁個別施設計画」の対象橋梁は、町が管理する主な橋梁 ３０７ 橋とします。

３．　橋梁個別施設計画の基本方針

方針１：損傷が深刻化・顕在化してはじめて大規模な補修や架け替えを行う従来の「対症療法型の維持管理」から定期的に点検を実施し軽微な損傷の段階で計画的な補修を行う「予防保全型の維持管理」へ転換します。

方針２：予防保全型の維持管理へ転換することにより、橋梁の長寿命化を目指すとともに、ライフサイクルコストの縮減と補修・更新費用の平準化を図ります。

方針３：道路橋定期点検要領（国土交通省 道路局 R06.3：以下「点検要領」）に基づき、近接目視による定期点検を計画的に実施し、その結果を基礎データとして、今後必要となる定期点検、補修、更新の時期を定め、計画的に実施します。

方針４：予防保全型の維持管理を推進するための人材育成及び橋梁に関する最新技術の取得に努めます。

方針５：今後の定期点検や補修の実施状況、補修技術の進展、財政事情や社会情勢の変化等を反映し、適宜計画を見直すこととします。

方針６：事業の効率化と維持管理費用の縮減に努めます。

① 新技術の活用：令和 10 年度までに、全管理橋梁について、修繕や点検に係る新技術の活用を検討し、約 10%のコスト縮減を目標とします。

② 費用縮減：令和 10 年度までに、橋長が短く構造が単純なコンクリート橋について年間 10 橋程度を目安に直営点検を実施し、年間約 200 万円の費用縮減を目標とします。また、点検結果および周辺道路の整備状況や地元住民の意見や利用状況等を踏まえ、今後 5 年間で 1 橋程度の集約化・撤去に取り組み、点検等維持管理費用約 50 万円の縮減を目標とします。

4． 健全度の評価

4.-1 判定区分

橋梁を構成する部材区分（床版、主桁、橋台、伸縮装置等）、損傷の種類（腐食、ひび割れ等）毎に「部材」の健全度を評価し、部材の重要性や損傷の進行状況、環境状況など様々な要因を総合的に勘案し、「橋梁」の健全度を評価します。「点検要領」より判定区分のⅠ～Ⅳに分類する場合の措置の基本的な考え方は以下のとおりです。


Ⅰ：監視や対策を行う必要のない状態をいう
Ⅱ：状況に応じて、監視や対策を行うことが望ましい状態をいう
Ⅲ：早期に監視や対策を行う必要がある状態をいう
Ⅳ：緊急に対策を行う必要がある状態をいう

道路橋毎の健全性の診断 判定区分

判定区分		判定の内容
Ⅰ	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
Ⅱ	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
Ⅲ	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
Ⅳ	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

4.-2 判定区分の割合

以下に１巡目（H26～H30）と２巡目（R1～R5）、及び令和８年度９月時点の３巡目（R6～R8）における判定区分の割合のグラフを示します。

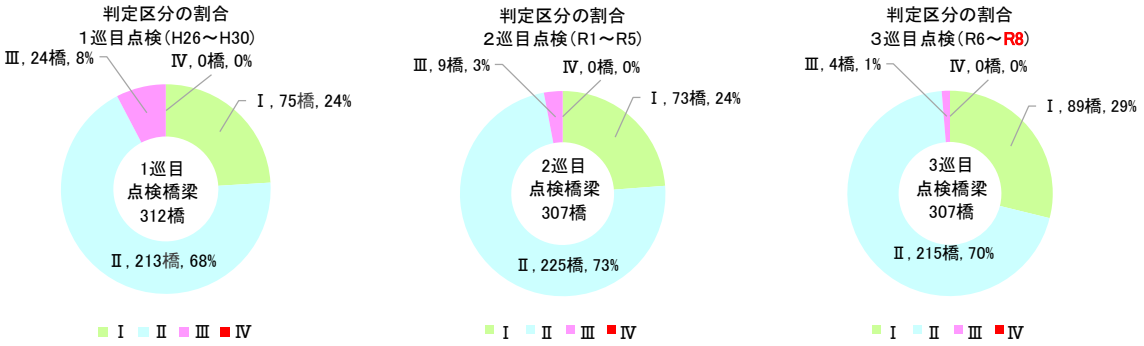


注）令和８年度で新たに２橋が追加されみなべ町が管理する橋梁数は 309 となったが、これら２橋はまだ点検が行われていないため、判定区分の対象橋梁の総数は 307 となる。

5.　計画期間

5.-1 計画期間

５年に１回の定期点検サイクルを踏まえ、点検間隔が明らかとなるよう計画期間は１０年とします。なお、点検結果等を踏まえ適宜、更新するとともに、点検や診断で得られた知見やノウハウの情報を的確に記録・更新していくことで、効果的かつ効率的な維持管理や、次期の適切な更新等につなげます。

本計画では、令和２年度（2020 年度）を初年度とし、令和 11 年度（2029 年度）までを計画期間とします。

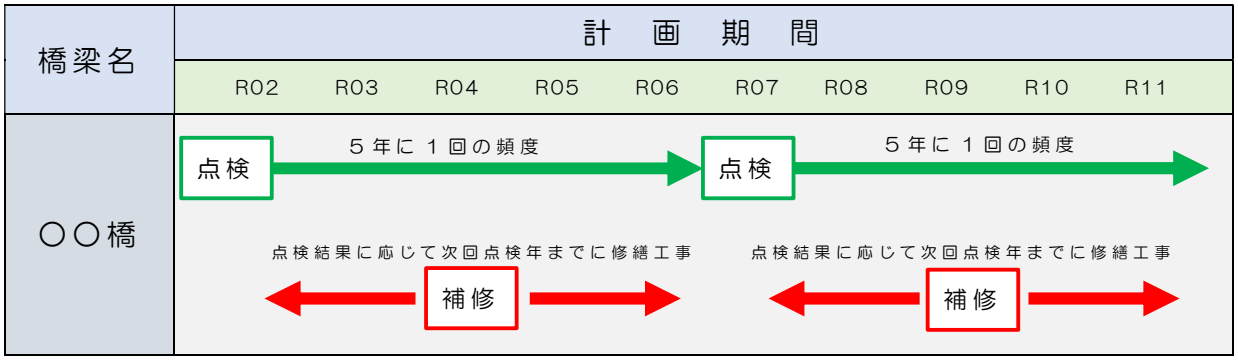

5.-2 修繕等措置の着手状況

修繕等の措置については、点検の次年度から設計に着手し、次回点検までに修繕等の工事が完了することを目標に対策を行います。

1巡目点検

点検年度（H26～H30）	対策数（Ⅲ、Ⅳ判定）	対策状況			
		着手数	着手率	完了数	完了率
平成26年度	0	0	0.0%	0	0.0%
平成27年度	1	1	100.0%	1	100.0%
平成28年度	5	5	100.0%	5	100.0%
平成29年度	8	8	100.0%	8	100.0%
平成30年度	10	10	100.0%	10	100.0%
合　　計	24	24	100.0%	24	100.0%

2巡目点検

点検年度（R1～R5）	対策数（Ⅲ、Ⅳ判定）	対策状況			
		着手数	着手率	完了数	完了率
令和1年度	0	0	0.0%	0	0.0%
令和2年度	4	4	100.0%	3	75.0%
令和3年度	0	0	0.0%	0	0.0%
令和4年度	4	4	100.0%	0	0.0%
令和5年度	1	1	100.0%	0	0.0%
合　　計	9	9	100.0%	3	33.3%

3巡目点検　　R08年度9月現在

点検年度（R1～R5）	対策数（Ⅲ、Ⅳ判定）	対策状況			
		着手数	着手率	完了数	完了率
令和6年度	0	0	0.0%	0	0.0%
令和7年度	0	0	0.0%	0	0.0%
令和8年度			0.0%		0.0%
令和9年度			0.0%		0.0%
令和10年度			0.0%		0.0%
合　　計	0	0	0.0%	0	0.0%

6．　対策の優先順位の考え方

点検結果に基づき、各橋梁の状態のほか、果たしている役割や機能、利用状況等を踏まえ、効率的な維持及び修繕が図れるよう必要措置を講じます。

なお、対策の優先順位は橋梁の健全性、第３者へ影響度や路線の重要度などを総合的に勘案して判断します。


優先度の考え方を以下に示します。

優先度評価指標	評価内容
主部材の損傷状況	主桁、床版等の主部材の損傷が著しい橋梁を優先
橋梁の重要度	重要路線に位置する橋梁を優先 跨線、跨道橋など第３者へ影響のある橋梁を優先 橋長が長い、もしくは幅員の広い橋梁を優先
大型車交通量	大型車交通量が多く、床版の疲労劣化の著しい橋梁を優先
適用示方書	旧い基準が適用されている橋梁を優先

７．　対策費用

予防保全型を基本とした維持管理計画の実施により、従来の対症療法型と比較すると、今後５０年間で約５９億円のコスト縮減が見込まれるとともに、一時的なコスト増も抑制され必要予算の平準化が可能となります。

シナリオごとの累計事業費用の比較

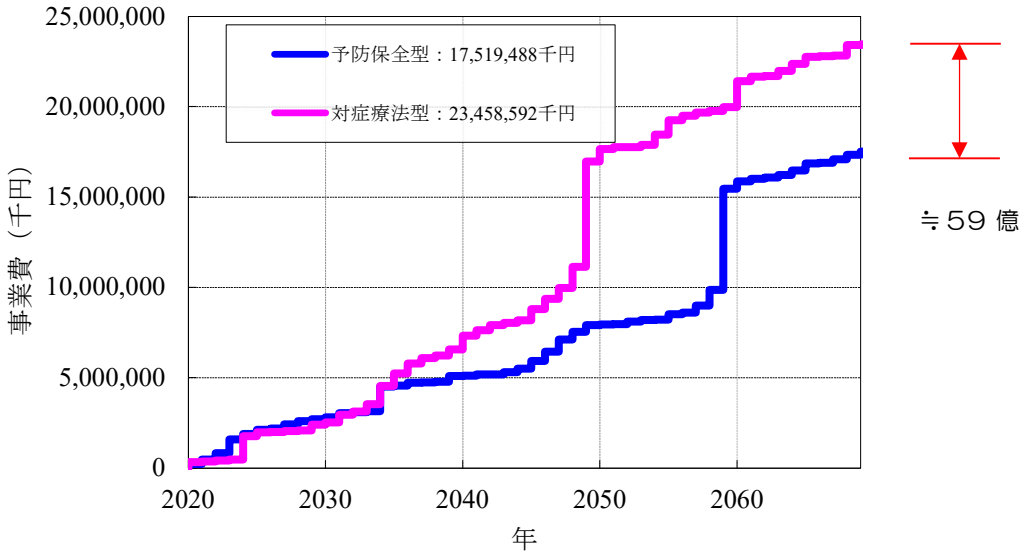

対策型	内　容
対症療法型	必要最低限の補修のみ実施し、寿命に達した時点で更新する費用を計上
予防保全型	損傷が軽微で最適な時期に補修を繰り返し、寿命に達した時点で更新する費用を計上

※上記のコスト縮減効果は現時点での点検結果、標準的な工法・単価などに基づき試算したものです。このため、今後の点検結果や補修状況等により変化するものであり、担保されたものではありません。

みなべ町　個別施設計画

判定区分　Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階

NO	管理番号	橋梁名	フリガナ	橋長(m)	径間数	全幅員(m)	橋梁の種類	架設年次(西暦)	修繕・点検・架替計画　(★:架替、○：定期点検、●：修繕工事、◆：撤去)										橋梁毎の判定区分	措置の主内容	修繕費(百万円)
									R02(2020)	R03(2021)	R04(2022)	R05(2023)	R06(2024)	R07(2025)	R08(2026)	R09(2027)	R10(2028)	R11(2029)			
1	4401	上神子垣内橋	ｶﾐﾐｺｶﾞｲﾄﾊﾞｼ	15.8	1	3.4	ＲＣ橋	2012	○					○					Ⅰ		
2	4402	睦橋	ﾑﾂﾐﾊﾞｼ	28.0	1	11.3	ＰＣ橋	2001	○					○					Ⅰ		
3	4403	下角橋	ｼﾓｶﾄﾞﾊﾞｼ	21.0	2	3.4	ＲＣ橋	1970	○					○					Ⅰ		
4	4404	小森郷橋	ｺﾓﾘｺﾞｳﾊﾞｼ	16.0	1	3.0	鋼溶接橋	1976	○					○					Ⅱ		
5	4405	城橋	ｼﾛﾊﾞｼ	16.0	1	5.0	ＲＣ橋	1972		○					○				Ⅱ		
6	4406	須賀橋	ｽｶﾞﾊﾞｼ	115.0	5	9.7	ＰＣ橋	2011		○					○				Ⅱ		
7	44071	学校橋	ｶﾞｯｺｳﾊﾞｼ	140.0	6	7.4	ＰＣ橋	1973		○					○		●	●	Ⅱ	表面被覆&ひび割れ注入&断面修復、床版防水工&上面増厚	174.6
8	44072	学校橋歩道橋	ｶﾞｯｺｳﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ	140.0	2	3.3	鋼溶接橋	1994		○					○				Ⅱ		
9	4408	天宝橋	ﾃﾝﾎﾟｳﾊﾞｼ	16.0	1	5.8	ＲＣ橋	1974	○					○					Ⅰ		
10	4409	入谷橋	ｲﾘﾀﾞﾆﾊﾞｼ	37.0	1	4.2	ＰＣ橋	1996		○					○				Ⅱ		
11	4410	小橋橋	ｺﾊﾞｼﾊﾞｼ	16.0	2	5.8	ＲＣ橋	1978		○					○				Ⅱ		
12	4411	広野大橋	ﾋﾛﾉｵｵﾊｼ	35.0	1	6.2	鋼溶接橋	1995	○					○					Ⅰ		
13	4412	笹里橋	ｻｻﾘﾊﾞｼ	30.0	1	5.2	鋼溶接橋	1980	○					○				●	Ⅱ	表面被覆&ひび割れ注入&断面修復	7.3
14	4413	嶋之瀬橋	ｼﾏﾉｾﾊﾞｼ	36.0	1	6.2	鋼溶接橋	1986	○					○					Ⅱ		
15	4414	宇呂住橋	ｳﾛｽﾐﾊﾞｼ	24.0	1	4.0	鋼溶接橋	1969	○					○					Ⅰ		
16	4415	小峠橋	ｺﾄｳｹﾞﾊﾞｼ	48.0	1	6.2	鋼溶接橋	1996		○					○				Ⅱ		
17	4417	奥谷橋	ｵｸﾀﾞﾆﾊﾞｼ	48.0	3	8.0	ＰＣ橋	1980		○					○				Ⅱ		
18	4419	宮ノ前橋	ﾐﾔﾉﾏｴﾊﾞｼ	17.0	2	3.2	ＲＣ橋	1967	○					○					Ⅱ		
19	4420	沼川橋	ﾇﾏｶﾞﾜﾊﾞｼ	30.0	1	5.2	鋼溶接橋	1990	○					○					Ⅰ		
20	4421	有ノ木橋	ｱﾘﾉｷﾊﾞｼ	23.0	1	6.2	ＰＣ橋	2001	○					○					Ⅱ		
21	4422	上広野橋	ｶﾐﾋﾛﾉﾊﾞｼ	15.0	1	3.2	鋼溶接橋	1981		○					○				Ⅰ		
22	4423	下隅橋	ｼﾓｽﾐﾊﾞｼ	18.5	1	5.2	鋼溶接橋	1981		○					○				Ⅰ		
23	4424	椎山橋	ｼｲﾔﾏﾊﾞｼ	48.0	6	4.4	ＲＣ橋	1975	○					○					Ⅰ		
24	4425	石倉橋	ｲｼｸﾗﾊﾞｼ	20.0	2	2.0	鋼溶接橋	1982	○					○					Ⅱ		
25	4426	中之瀬橋	ﾅｶﾉｾﾊﾞｼ	25.0	2	5.2	ＲＣ橋	1949		○					○				Ⅱ		
26	4427	寒者橋	ｶﾝｼﾞｬﾊﾞｼ	15.0	1	6.0	ＲＣ橋	1989		○					○				Ⅱ		
27	4428	第１出合橋	ﾀﾞｲｲﾁﾃﾞｱｲﾊﾞｼ	16.0	1	4.7	(鋼溶接橋)	1972		◆										撤去	
28	4429	虫野橋	ﾑｼﾉﾊﾞｼ	17.0	1	3.2	鋼溶接橋	1983	○					○					Ⅱ		
29	4430	犬郷上橋	ｲﾇｺﾞｳｶﾐﾊﾞｼ	29.0	2	2.8	鋼溶接橋	1969		○					○				Ⅱ		
30	4431	犬郷下橋	ｲﾇｺﾞｳｼﾓﾊﾞｼ	29.0	2	2.8	鋼溶接橋	1969		○					○				Ⅱ		
31	4432	潰橋	ﾂｴﾊﾞｼ	21.0	3	2.8	ＲＣ橋	1982		○					○				Ⅰ		
32	4433	藤六橋	ﾄｳﾛｸﾊﾞｼ	22.0	1	3.1	鋼溶接橋	1980	○					○					Ⅰ		
33	4434	向平橋	ﾑｶｲﾀﾞｲﾗﾊﾞｼ	27.0	1	3.3	鋼溶接橋	1988		○					○				Ⅱ		
34	4435	穂手見橋	ﾎﾃﾐﾊﾞｼ	35.0	1	5.0	鋼溶接橋	1990		○					○				Ⅰ		
35	4436	東玉垣内橋	ﾋｶﾞｼﾀﾞﾏｶﾞｲﾄﾊﾞｼ	15.0	1	3.0	ＲＣ橋	1988	○					○					Ⅱ		
36	4437	串橋	ｸｼﾊﾞｼ	16.0	1	6.2	ＲＣ橋	1990	○					○					Ⅰ		
37	4438	新上ボク橋	ｼﾝｶﾐﾎﾞｸﾊﾞｼ	15.0	1	6.2	ＲＣ橋	1990	○					○					Ⅰ		
38	4439	新屋敷橋	ｼﾝﾔｼｷﾊﾞｼ	15.0	1	6.2	ＲＣ橋	1996	○					○					Ⅰ		
39	4440	樫平橋	ｶｼﾀﾞｲﾗﾊﾞｼ	21.0	1	7.2	鋼溶接橋	2001	○					○					Ⅰ		
40	4441	弥生橋	ﾔﾖｲﾊﾞｼ	21.0	1	11.3	ＰＣ橋	2002		○					○				Ⅱ		
41	4442	新寺川橋	ｼﾝﾃﾗｶﾜﾊﾞｼ	32.0	1	8.2	鋼溶接橋	1995		○					○				Ⅱ		
42	4443	新下西又橋	ｼﾝｼﾓﾆｼﾏﾀﾊﾞｼ	14.5	1	8.0	ＲＣ橋	1997	○					○					Ⅰ		
43	4444	遺犬谷跨道橋	ｲｹﾝﾀﾞﾆｺﾄﾞｳｷｮｳ	19.0	1	4.0	ＰＣ橋	2000	○					○				●	Ⅱ	床版防水工&ひび割れ注入&断面修復&伸縮取替え(両端)等	6.3
44	4445	上奥谷橋	ｶﾐｵｸﾀﾞﾆﾊﾞｼ	16.0	1	6.2	ＰＣ橋	1999	○					○					Ⅰ		
45	4447	政井谷1号橋	ﾏｻｲﾀﾞﾆｲﾁｺﾞｳｷｮｳ	50.0	3	6.0	ＰＣ橋	2000		○					○				Ⅰ		
46	4501	汐入橋	ｼｵｲﾘﾊﾞｼ	24.0	1	8.2	ＰＣ橋	1998		○					○		●		Ⅱ	表面被覆&ひび割れ注入&伸縮装置：取替え(両端)等	6.0
47	4502	王子橋	ｵｳｼﾞﾊﾞｼ	31.0	1	7.0	鋼溶接橋	1975		○					○				Ⅱ		

みなべ町　個別施設計画

判定区分　Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階

NO	管理番号	橋梁名	フリガナ	橋長(m)	径間数	全幅員(m)	橋梁の種類	架設年次(西暦)	修繕・点検・架替計画（★:架替、○：定期点検、●：修繕工事、◆：撤去）										橋梁毎の判定区分	措置の主内容	修繕費(百万円)
									R02(2020)	R03(2021)	R04(2022)	R05(2023)	R06(2024)	R07(2025)	R08(2026)	R09(2027)	R10(2028)	R11(2029)			
48	4503	新庄橋	ｼﾝｼﾞｮｳﾊﾞｼ	123.0	6	3.5	（ＲＣ橋）	1964	○					◆	◆				Ⅲ	撤去	91.0
49	4504	古川橋	ﾌﾙｶﾜﾊﾞｼ	27.0	1	6.0	ＰＣ橋	1984	○	●				○					Ⅰ		
50	4505	北茶屋橋	ｷﾀﾁｬﾔﾊﾞｼ	22.0	1	5.1	ＰＣ橋	1983	○					○					Ⅰ		
51	4506	下川原橋	ｼﾓｶﾜﾗﾊﾞｼ	22.0	1	5.1	ＰＣ橋	1985	○					○					Ⅰ		
52	4507	広畑新橋	ﾋﾛﾊﾀｼﾝﾊﾞｼ	18.0	1	6.2	ＰＣ橋	1993	○					○					Ⅱ		
53	4508	お宮橋	ｵﾐﾔﾊﾞｼ	17.0	1	5.3	ＰＣ橋	1994		○					○				Ⅰ		
54	4509	高津尾橋	ﾀｶﾂｵﾊﾞｼ	17.0	1	8.2	ＰＣ橋	1998		○					○				Ⅱ		
55	4510	里神橋	ｻﾄｶﾞﾐﾊﾞｼ	16.0	1	5.2	ＰＣ橋	1996		○					○				Ⅰ		
56	4511	西中村橋	ﾆｼﾅｶﾑﾗﾊﾞｼ	15.0	1	5.2	ＰＣ橋	1997		○					○				Ⅰ		
57	4512	越谷橋	ｺｼｶﾞﾆﾊﾞｼ	15.0	1	6.0	ＲＣ橋	1990	○					○			●		Ⅱ	表面被覆&ひび割れ注入&断面修復	8.5
58	4513	栄橋	ｻｶｴﾊﾞｼ	21.0	1	14.3	ＰＣ橋	1999	○					○					Ⅱ		
59	4514	檜新橋	ﾋﾉｷｼﾝﾊﾞｼ	16.0	1	6.1	ＰＣ橋	2005		○					○				Ⅰ		
60	4515	井月橋	ｲｹﾂｷﾊﾞｼ	16.0	1	6.2	ＰＣ橋	2003		○					○				Ⅰ		
61	4516	殿開橋	ﾄﾉﾋﾞﾗｷﾊﾞｼ	21.0	1	3.8	鋼溶接橋	2004	○					○					Ⅱ		
62	4517	奥谷薬師堂橋	ｵｸﾀﾞﾆﾔｸｼﾄﾞｳﾊﾞｼ	17.0	1	6.7	鋼溶接橋	不明		○					○				Ⅱ		
63	4518	小屋垣内橋	ｺﾔｶﾞｲﾄﾊﾞｼ	29.0	1	8.2	ＰＣ橋	2007	○					○					Ⅰ		
64	4519	勢力橋	ｾｲﾘｷﾊﾞｼ	17.0	1	6.7	ＰＣ橋	2001		○					○				Ⅱ		
65	4520	鳥田橋	ﾄﾘﾀﾊﾞｼ	19.0	1	5.2	ＰＣ橋	2010		○					○				Ⅰ		
66	4521	みなべ新橋	ﾐﾅﾍﾞｼﾝﾊﾞｼ	191.0	5	9.9	ＰＣ橋	2010	○					○					Ⅱ		
67	4522	共和新橋	ｷｮｳﾜｼﾝﾊﾞｼ	126.0	3	8.2	ＰＣ橋	2003		○					○				Ⅱ		
68	4523	神出橋	ｼﾞﾝﾃﾞﾊﾞｼ	80.0	2	7.2	鋼溶接橋	2008		○					○				Ⅱ		
69	4524	新宇呂住橋	ｼﾝｳﾛｽﾐﾊﾞｼ	27.0	1	3.3	鋼溶接橋	1990		○					○				Ⅱ		
70	4525	高橋	ﾀｶﾊｼ	28.0	3	5.1	ＲＣ橋	1937		○					○				Ⅱ		
71	4526	新鎌倉橋	ｼﾝｶﾏｸﾗﾊﾞｼ	25.0	1	5.2	ＰＣ橋	2007		○					○				Ⅱ		
72	4527	新伏兎野橋	ｼﾝﾌﾄﾞﾉﾊﾞｼ	26.0	1	5.2	ＰＣ橋	2006		○					○				Ⅱ		
73	4528	広野橋	ﾋﾛﾉﾊﾞｼ	89.0	2	7.2	ＰＣ橋	2009		○					○				Ⅱ		
74	4530	馬桶橋	ｳﾏｵｹﾊﾞｼ	80.0	3	7.2	ＰＣ橋	2010		○					○				Ⅱ		
75	4531	半田橋	ﾊﾝﾀﾞﾊﾞｼ	27.0	1	9.2	ＰＣ橋	2008		○					○				Ⅱ		
76	5001	上下谷橋	ｶﾐｼﾓﾀﾞﾆﾊﾞｼ	4.0	1	2.5	ＲＣ橋	不明					○					○	Ⅱ		
77	5002	下谷橋	ｼﾓﾀﾞﾆﾊﾞｼ	4.0	1	2.4	ＲＣ橋	不明					○					○	Ⅱ		
78	5003	角仏橋	ｶｸﾌﾞﾂﾊﾞｼ	2.0	1	4.5	ＲＣ橋	不明					○					○	Ⅱ		
79	5004	池田橋	ｲｹﾀﾞﾊﾞｼ	4.0	1	6.0	ＲＣ橋	不明					○				●	○	Ⅱ	表面被覆&ひび割れ注入&断面修復	5.0
80	5005	日浦川橋	ﾋｳﾗｶﾞﾜﾊﾞｼ	2.0	1	9.2	ＲＣ橋	不明					○					○	Ⅱ		
81	5006	堤ヶ坪橋	ﾂﾂﾐｶﾞﾂﾎﾞﾊﾞｼ	2.0	1	16.2	ＲＣ橋	不明					○					○	Ⅱ		
82	5013	柳町橋	ﾔﾅｷﾞﾁｮｳﾊﾞｼ	6.0	1	6.2	ＰＣ橋	2017			○					○			Ⅱ		
83	5015	古川右岸2号橋	ﾌﾙｶﾜｳｶﾞﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ)	2.0	1	10.8	ＲＣ橋	不明					○					○	Ⅱ		
84	5018	和田橋	ﾜﾀﾞﾊﾞｼ	3.0	1	6.0	ＲＣ橋	不明					○					○	Ⅱ		
85	5019	玄田呂橋	ｹﾞﾝﾀﾞﾛﾊﾞｼ	3.0	1	3.3	ＲＣ橋	不明	○	●				○					Ⅰ		
86	5020	山桃橋	ﾔﾏﾓﾓﾊﾞｼ	2.0	1	3.0	ＲＣ橋	不明					○					○	Ⅱ		
87	5021	目良田橋	ﾒﾗﾀﾊﾞｼ	3.0	1	3.8	ＲＣ橋	不明	○	●				○					Ⅰ		
88	5024	流ル橋	ﾅｶﾞﾙﾊﾞｼ	6.0	1	9.7	ＲＣ橋	不明					○					○	Ⅰ		
89	5026	北中相橋	ｷﾀﾅｶｱﾊﾞｼ	2.0	1	4.8	ＲＣ橋	不明	○					○					Ⅰ		
90	5028	新崎橋	ｼﾝｻﾞｷﾊﾞｼ	2.0	1	6.2	ＲＣ橋	不明	○					○					Ⅱ		
91	5029	外川原橋	ｿﾄｶﾞﾜﾗﾊﾞｼ	4.0	1	4.4	ＲＣ橋	不明	○				●	○					Ⅰ		
92	5032	奥鳶ヶ谷橋	ｵｸﾄﾋﾞｶﾞﾀﾆﾊﾞｼ	4.0	1	2.8	ＲＣ橋	不明		○					○				Ⅰ		
93	5033	藤ノ尾橋	ﾌｼﾞﾉｵﾊﾞｼ	5.0	1	3.7	ＲＣ橋	不明		○					○				Ⅰ		
94	5034	天神橋	ﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞｼ	3.0	1	8.1	ＲＣ橋	不明	○					○					Ⅰ		

みなべ町　個別施設計画

判定区分　Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階

NO	管理番号	橋梁名	フリガナ	橋長(m)	径間数	全幅員(m)	橋梁の種類	架設年次(西暦)	修繕・点検・架替計画　(★:架替、○：定期点検、●：修繕工事、◆：撤去)										橋梁毎の判定区分	措置の主内容	修繕費(百万円)
									R02(2020)	R03(2021)	R04(2022)	R05(2023)	R06(2024)	R07(2025)	R08(2026)	R09(2027)	R10(2028)	R11(2029)			
95	5035	野原橋	(ﾉﾜﾗﾊﾞｼ)	4.0	1	3.0	ＲＣ橋	不明	○					○					Ⅰ		
96	5036	後々田橋	(ｺﾞｺﾞﾀﾞﾊﾞｼ)	4.0	1	5.7	ＲＣ橋	不明	○				●	○					Ⅱ		
97	5038	小谷橋	(ｺﾀﾆﾊﾞｼ)	11.0	1	8.0	ＲＣ橋	不明		○					○				Ⅱ		
98	5039	川原橋	(ｶﾜﾗﾊﾞｼ)	11.0	2	4.2	(ＲＣ橋)	不明		◆										撤去	
99	5040	霞橋	(ｶｽﾐﾊﾞｼ)	10.0	1	5.1	ＲＣ橋	不明		○					○				Ⅱ		
100	5041	井出橋	(ｲﾃﾞﾊﾞｼ)	6.0	2	3.8	ＲＣ橋	不明		○					○				Ⅱ		
101	5042	王子前橋	(ｵｳｼﾞﾏｴﾊﾞｼ)	3.0	1	8.9	ＲＣ橋	不明	○					○					Ⅰ		
102	5044	井原橋	(ｲﾊﾗﾊﾞｼ)	4.0	1	2.9	ＲＣ橋	不明					○					○	Ⅰ		
103	5045	住吉橋	(ｽﾐﾖｼﾊﾞｼ)	4.0	1	5.5	ＲＣ橋	不明					○					○	Ⅰ		
104	5046	塚ノ坪橋	(ﾂｶﾉﾂﾎﾞﾊﾞｼ)	2.0	1	2.0	ＲＣ橋	不明					○					○	Ⅰ		
105	5049	舟倉橋	(ﾌﾅｸﾗﾊﾞｼ)	15.4	1	7.2	ＰＣ橋	2023					○					○	Ⅰ		
106	5051	八反田橋	(ﾊｯﾀﾝﾀﾞﾊﾞｼ)	4.0	1	5.5	ＲＣ橋	不明					○					○	Ⅰ		
107	5052	七反田橋	(ｼﾁﾀﾝﾀﾞﾊﾞｼ)	4.0	1	7.5	ＲＣ橋	不明					○					○	Ⅱ		
108	5054	寺橋	(ﾃﾗﾊﾞｼ)	4.0	1	4.6	ＲＣ橋	不明					○					○	Ⅱ		
109	5055	岡前橋	(ｵｶﾏｴﾊﾞｼ)	4.0	1	2.2	鋼溶接橋	不明					○					○	Ⅱ		
110	5056	広佐橋	(ﾋﾛｻﾊﾞｼ)	7.0	1	5.4	ＲＣ橋	不明					○					○	Ⅰ		
111	5057	佐古橋	(ｻｺﾊﾞｼ)	5.0	1	3.7	ＲＣ橋	不明	○					○					Ⅱ		
112	5058	尾田橋	(ｵﾀﾞﾊﾞｼ)	7.0	1	3.6	ＲＣ橋	1956			○					○			Ⅱ		
113	5059	大谷橋	(ｵｵﾀﾆﾊﾞｼ)	6.0	1	5.7	ＲＣ橋	1972			○					○			Ⅱ		
114	5060	世美谷橋	(ｾﾐﾀﾞﾆﾊﾞｼ)	5.0	1	2.8	ＲＣ橋	1956	○					○					Ⅱ		
115	5061	有屋谷橋	(ｱﾘﾔﾀﾞﾆﾊﾞｼ)	4.0	1	2.9	ＲＣ橋	不明	○					○					Ⅱ		
116	5062	池尻橋	(ｲｹｼﾞﾘﾊﾞｼ)	4.0	1	2.4	ＲＣ橋	不明	○					○					Ⅱ		
117	5063	井谷橋	(ｲﾀﾞﾆﾊﾞｼ)	4.0	1	3.8	ＲＣ橋	不明	○					○					Ⅱ		
118	5064	地原橋	(ｼﾞﾊﾗﾊﾞｼ)	3.0	1	9.1	ＲＣ橋	不明	○					○					Ⅱ		
119	5065	講田橋	(ｺｳﾃﾞﾝﾊﾞｼ)	3.0	1	8.9	ＲＣ橋	不明	○					○					Ⅱ		
120	5066	清水橋	(ｼﾐｽﾞﾊﾞｼ)	3.0	1	6.6	ＲＣ橋	不明	○					○			●		Ⅱ	表面被覆&ひび割れ注入&断面修復	4.0
121	5067	講地橋	(ｺｳﾁﾞﾊﾞｼ)	3.0	1	4.3	ＲＣ橋	不明	○					○					Ⅰ		
122	5068	新田橋	(ﾆｯﾀﾊﾞｼ)	3.0	1	8.3	ＲＣ橋	不明	○					○				●	Ⅱ	表面被覆&ひび割れ注入&断面修復	4.0
123	5069	佐々木橋	(ｻｻｷﾊﾞｼ)	5.0	1	4.7	ＲＣ橋	不明			○					○			Ⅱ		
124	5070	津殿橋	(ﾂﾄﾞﾉﾊﾞｼ)	3.0	1	4.8	ＲＣ橋	不明			○					○			Ⅱ		
125	5071	三ツ橋	(ﾐﾂﾊﾞｼ)	3.0	1	3.2	ＲＣ橋	不明			○					○			Ⅱ		
126	5072	瓜谷河原橋	(ｳﾘﾀﾞﾆｶﾜﾗﾊﾞｼ)	12.0	1	8.0	ＲＣ橋	不明			○					○			Ⅱ		
127	5073	片山橋	(ｶﾀﾔﾏﾊﾞｼ)	9.0	1	3.4	ＲＣ橋	不明			○					○			Ⅱ		
128	5074	大久保橋	(ｵｵｸﾎﾞﾊﾞｼ)	3.0	1	2.6	ＲＣ橋	不明	○					○					Ⅱ		
129	5075	庄司橋	(ｼｮｳｼﾞﾊﾞｼ)	7.0	1	2.8	ＲＣ橋	不明		●○					○				Ⅰ		
130	5076	岩鼻橋	(ｲﾜﾊﾅﾊﾞｼ)	9.0	1	4.9	ＲＣ橋	不明			○					○			Ⅱ		
131	5077	猿神橋	(ｻﾙｶﾞﾐﾊﾞｼ)	10.0	1	3.3	ＲＣ橋	不明			○					○			Ⅱ		
132	5079	須賀宮前橋	(ｽｶﾞﾐﾔﾏｴﾊﾞｼ)	5.0	1	4.3	ＲＣ橋	不明			○					○			Ⅱ		
133	5080	右エ門橋	(ｳｴﾓﾝﾊﾞｼ)	11.0	1	6.2	ＰＣ橋	1999			○					○			Ⅱ		
134	5081	申橋	(ｻﾙﾊﾞｼ)	11.0	1	5.2	ＰＣ橋	1999			○					○			Ⅱ		
135	5082	水越橋	(ﾐｽﾞｺｼﾊﾞｼ)	11.0	1	6.2	ＰＣ橋	1999			○					○			Ⅱ		
136	5083	五條橋	(ｺﾞｼﾞｮｳﾊﾞｼ)	2.0	1	5.8	ＲＣ橋	不明		○					○				Ⅰ		
137	5085	内田橋	(ｳﾁﾀﾞﾊﾞｼ)	2.0	1	4.5	ＲＣ橋	不明		●○					○				Ⅰ		
138	5086	荒堀橋	(ｱﾗﾎﾞﾘﾊﾞｼ)	3.0	1	6.9	ＲＣ橋	不明		○					○				Ⅱ		
139	5087	砂止橋	(ｽﾅﾄﾞﾒﾊﾞｼ)	4.0	1	3.3	ＲＣ橋	不明	○					○					Ⅱ		
140	5088	上坂本橋	(ｶﾐｻｶﾓﾄﾊﾞｼ)	3.0	1	2.9	ＲＣ橋	不明			○					○			Ⅱ		
141	5089	坂本橋	(ｻｶﾓﾄﾊﾞｼ)	3.0	1	2.3	ＲＣ橋	不明			○					○			Ⅱ		

みなべ町　個別施設計画

判定区分　Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階

NO	管理番号	橋梁名	フリガナ	橋長(m)	径間数	全幅員(m)	橋梁の種類	架設年次(西暦)	修繕・点検・架替計画（★：架替、○：定期点検、●：修繕工事、◆：撤去）										橋梁毎の判定区分	措置の主内容	修繕費(百万円)
									R02(2020)	R03(2021)	R04(2022)	R05(2023)	R06(2024)	R07(2025)	R08(2026)	R09(2027)	R10(2028)	R11(2029)			
142	5090	前川橋	(ﾏｴｶﾜﾊﾞｼ)	7.0	1	4.8	ＲＣ橋	不明			○					○			Ⅱ		
143	5091	下栗橋	(ｼﾓｸﾞﾘﾊﾞｼ)	13.0	1	6.0	鋼溶接橋	不明			○				●	○ ●			Ⅲ	塗替塗装 断面修復	40.0
144	5092	上栗橋	(ｶﾐｸﾞﾘﾊﾞｼ)	11.0	1	7.0	ＲＣ橋	不明			○					○			Ⅱ		
145	5093	坂口橋	(ｻｶｸﾞﾁﾊﾞｼ)	10.0	1	2.8	ＲＣ橋	不明			○					○			Ⅱ		
146	5094	重之谷橋	(ｼﾞｭｳﾉﾀﾆﾊﾞｼ)	11.0	1	3.0	鋼溶接橋	不明			○					○			Ⅱ		
147	5095	宮前橋	(ﾐﾔﾏｴﾊﾞｼ)	10.0	1	2.8	ＲＣ橋	1962			○			●		○			Ⅲ	ひびわれ補修・注入 断面修復	8.0
148	5096	内垣内橋	(ｳﾁｶﾞｲﾄﾊﾞｼ)	10.0	1	2.9	ＲＣ橋	不明			○					○			Ⅱ		
149	5097	辺川橋	(ﾍｶﾞﾜﾊﾞｼ)	12.0	1	3.4	ＲＣ橋	不明			○			●		○			Ⅲ	ひびわれ補修・注入 断面修復	10.0
150	5098	久下橋	(ｸｹﾞﾊﾞｼ)	2.0	1	6.9	ＲＣ橋	不明		○					○				Ⅰ		
151	5099	大日橋	(ﾀﾞｲﾆﾁﾊﾞｼ)	2.0	1	4.6	ＲＣ橋	不明		○					○				Ⅰ		
152	5100	奥谷池橋	(ｵｸﾀﾞﾆｲｹﾊﾞｼ)	13.0	1	2.9	鋼溶接橋	不明			○				●	○			Ⅲ	塗替塗装 断面修復	10.0
153	5101	神ノ倉橋	(ｶﾝﾉｸﾗﾊﾞｼ)	10.0	1	2.4	鋼溶接橋	不明			○					○			Ⅱ		
154	5102	唐ヶ谷橋	(ｶﾗｶﾞﾀﾆﾊﾞｼ)	3.0	1	2.9	ＲＣ橋	不明			○					○			Ⅱ		
155	5104	玉橋	(ﾀﾞﾏﾊﾞｼ)	14.0	1	3.8	ＲＣ橋	不明	●		○					○			Ⅰ		
156	5105	田ノ谷橋	(ﾀﾉﾀﾆﾊﾞｼ)	10.0	1	3.1	鋼溶接橋	不明			○					○			Ⅱ		
157	5106	横郷下橋	(ﾖｺｺﾞｳｼﾓﾊﾞｼ)	4.0	1	4.2	ＲＣ橋	不明			○					○			Ⅰ		
158	5107	横郷中橋	(ﾖｺｺﾞｳﾅｶﾊﾞｼ)	6.0	1	3.3	ＲＣ橋	不明			○					○			Ⅱ		
159	5108	横郷上橋	(ﾖｺｺﾞｳｶﾐﾊﾞｼ)	5.0	1	3.2	ＲＣ橋	不明			○					○			Ⅱ		
160	5109	第2講地橋	(ﾀﾞｲﾆｺｳﾁﾞﾊﾞｼ)	2.0	1	2.5	ＲＣ橋	不明	○					○					Ⅰ		
161	5110	鍵田橋	(ｶｷﾞﾀﾊﾞｼ)	2.0	1	2.4	ＲＣ橋	不明	○					○					Ⅱ		
162	5111	苗代橋	(ﾅﾜｼﾛﾊﾞｼ)	12.0	1	3.7	ＲＣ橋	1980			○					○			Ⅱ		
163	5112	中相橋	(ﾅｶｱﾊﾞｼ)	12.0	1	7.0	ＲＣ橋	不明			○					○			Ⅱ		
164	5113	樫ノ口橋	(ｶｼﾉｸﾞﾁﾊﾞｼ)	3.0	1	2.6	ＲＣ橋	1991		○					○				Ⅱ		
165	5501	道筋橋	(ﾐﾁｽｼﾞﾊﾞｼ)	3.0	1	8.5	ＲＣ橋	不明			○					○			Ⅱ		
166	5502	堺壱丁田橋	(ｻｶｲｲｯﾁｮｳﾀﾞﾊﾞｼ)	5.0	1	7.7	ＲＣ橋	不明		●	○					○			Ⅱ		
167	5503	西ノ谷橋	(ﾆｼﾉﾀﾆﾊﾞｼ)	8.0	1	6.0	ＲＣ橋	不明			○					○			Ⅱ		
168	5504	堺橋	(ｻｶｲﾊﾞｼ)	5.0	1	5.1	ＲＣ橋	不明		●	○					○			Ⅱ		
169	5505	二川橋	(ﾆｶﾞﾜﾊﾞｼ)	11.0	1	6.0	ＲＣ橋	不明			○					○			Ⅱ		
170	5506	南茶屋橋	(ﾐﾅﾐﾁｬﾔﾊﾞｼ)	12.0	1	7.3	ＰＣ橋	2008			○					○		●	Ⅱ	表面被覆&ひび割れ注入&断面修復	7.2
171	5507	皆浦橋	(ﾐﾅｳﾗﾊﾞｼ)	10.0	1	6.0	ＲＣ橋	不明			○					○			Ⅱ		
172	5508	山手道路橋	(ﾔﾏﾃﾄﾞｳﾛﾊﾞｼ)	13.0	1	4.0	ＰＣ橋	不明			○					○	●		Ⅱ	橋面防水&表面被覆&ひび割れ注入&断面修復	10.1
173	5509	尾締川橋	(ｵｼﾞﾒｶﾞﾜﾊﾞｼ)	2.0	1	5.3	ＲＣ橋	不明		○					○				Ⅱ		
174	5510	井ノ台橋	(ｲﾉﾀﾞｲﾊﾞｼ)	2.0	1	11.8	ＲＣ橋	不明		○					○				Ⅱ		
175	5511	小山田橋	(ｵﾔﾏﾀﾞﾊﾞｼ)	2.0	1	9.2	(ＲＣ橋)	不明			◆									撤去	
176	5513	井附橋	(ｲﾂｷﾊﾞｼ)	7.0	1	5.0	ＰＣ橋	不明		○					○				Ⅰ		
177	5514	大年新庄線1号橋	(ｵｵﾄｼｼﾝｼﾞｮｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ)	2.0	1	6.8	ＰＣ橋	不明		○					○				Ⅱ		
178	5515	乱レ橋	(ﾐﾀﾞﾚﾊﾞｼ)	4.0	1	4.0	ＲＣ橋	不明		○					○				Ⅰ		
179	5516	南部平野農道橋	(ﾐﾅﾍﾞﾍｲﾔﾉｳﾄﾞｳｷｮｳ)	13.0	1	5.0	ＰＣ橋	不明			○					○			Ⅱ		
180	5517	地蔵作り橋	(ｼﾞｿﾞｳﾂｸﾘﾊﾞｼ)	3.0	1	6.2	ＲＣ橋	不明		○					○				Ⅱ		
181	5518	這上り橋	(ﾊｲｱｶﾞﾘﾊﾞｼ)	2.0	1	2.4	ＲＣ橋	不明		○					○				Ⅱ		
182	5521	中通橋	(ﾅｶﾄﾞｵﾘﾊﾞｼ)	4.0	1	4.2	ＲＣ橋	不明		○					○				Ⅱ		
183	5522	堤ヶ内橋	(ﾂﾂﾐｶﾞｳﾁﾊﾞｼ)	2.0	1	3.2	ＰＣ橋	不明		○					○				Ⅱ		
184	5523	西ヶ坪橋	(ﾆｼｶﾞﾂﾎﾞﾊﾞｼ)	3.0	1	3.0	ＰＣ橋	不明		○					○				Ⅱ		
185	5525	河原畑橋	(ｶﾜﾗﾊﾞﾀﾊﾞｼ)	2.0	1	4.2	ＲＣ橋	不明		○					○				Ⅱ		
186	5526	青連前橋	(ｼｮｳﾚﾝﾏｴﾊﾞｼ)	3.0	1	7.1	ＰＣ橋	不明	○					○					Ⅱ		
187	5527	青連川原橋	(ｼｮｳﾚﾝｶﾜﾗﾊﾞｼ)	3.0	1	3.7	ＰＣ橋	不明	○					○					Ⅱ		
188	5528	下流ル橋	(ｼﾓﾅｶﾞﾙﾊﾞｼ)	7.0	1	7.0	ＲＣ橋	不明		○					○				Ⅱ		

みなべ町　個別施設計画

判定区分　Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階

NO	管理番号	橋梁名	フリガナ	橋長(m)	径間数	全幅員(m)	橋梁の種類	架設年次(西暦)	修繕・点検・架替計画　(★:架替、○：定期点検、●：修繕工事、◆：撤去)										橋梁毎の判定区分	措置の主内容	修繕費(百万円)
									R02(2020)	R03(2021)	R04(2022)	R05(2023)	R06(2024)	R07(2025)	R08(2026)	R09(2027)	R10(2028)	R11(2029)			
189	5529	畑ヶ谷橋	ﾊﾀｶﾞﾀﾆﾊﾞｼ	3.0	1	5.0	ＲＣ橋	不明			○					○			Ⅱ		
190	5530	上大谷橋	ｶﾐｵｵﾀﾆﾊﾞｼ	4.0	1	5.2	ＲＣ橋	不明	○					○					Ⅰ		
191	5531	東大谷橋	ﾋｶﾞｼｵｵﾀﾆﾊﾞｼ	8.0	1	3.0	ＲＣ橋	不明			○					○			Ⅱ		
192	6001	芦硲橋	ｱｼｻｺﾊﾞｼ	14.0	1	4.7	鋼溶接橋	不明			○					○			Ⅱ		
193	6002	漆谷橋	ｳﾙｼﾀﾞﾆﾊﾞｼ	4.0	1	4.3	ＲＣ橋	不明			○					○			Ⅱ		
194	6003	恵比須橋	ｴﾋﾞｽﾊﾞｼ	7.0	1	3.6	鋼溶接橋	不明			○					○			Ⅱ		
195	6004	中津橋	ﾅｶﾂﾊﾞｼ	8.0	1	6.6	ＲＣ橋	1984			○					○			Ⅱ		
196	6009	下堀橋	ｼﾓﾎﾞﾘﾊﾞｼ	3.0	1	4.3	ＲＣ橋	不明			○					○			Ⅱ		
197	6010	寺川橋	ﾃﾗｶﾜﾊﾞｼ	14.0	1	4.9	ＲＣ橋	1972			○					○			Ⅱ		
198	6011	下高野橋	ｼﾓﾀﾞｶﾉﾊﾞｼ	15.0	1	2.5	ＲＣ橋	1960		●	○					○			Ⅱ		
199	6012	宝橋	ﾀｶﾗﾊﾞｼ	18.0	1	11.3	ＰＣ橋	2003		○					○				Ⅱ		
200	6013	城西橋	ｼﾞｮｳｾｲﾊﾞｼ	9.0	1	4.6	鋼溶接橋	不明			○					○			Ⅱ		
201	6014	下代橋	ｹﾞｼﾛﾊﾞｼ	2.0	1	3.2	ＲＣ橋	不明			○					○			Ⅱ		
202	6015	数永橋	ｶｽﾞﾅｶﾞﾊﾞｼ	11.0	1	2.6	ＲＣ橋	1964			○					○			Ⅱ		
203	6016	氷川橋	ﾋｶﾜｶﾞﾜﾊﾞｼ	7.0	1	3.1	ＲＣ橋	不明			○					○			Ⅰ		
204	6017	北谷橋	ｷﾀﾀﾞﾆﾊﾞｼ	3.0	1	2.7	ＲＣ橋	不明			○					○			Ⅱ		
205	6018	上井ノ上橋	ｶﾐｲﾉｳｴﾊﾞｼ	11.0	1	4.7	ＲＣ橋	不明			○					○			Ⅰ		
206	6019	中の瀬橋	ﾅｶﾉｾﾊﾞｼ	13.0	1	5.8	ＲＣ橋	1973			○					○			Ⅱ		
207	6020	久保橋	ｸﾎﾞﾊﾞｼ	9.0	1	5.3	ＲＣ橋	不明			○					○	●		Ⅱ	表面被覆&ひび割れ注入&断面修復	7.9
208	6021	違井橋	ﾁｶﾞｲﾊﾞｼ	9.0	1	3.2	鋼溶接橋	不明			○					○			Ⅱ		
209	6022	下手橋	ｼﾓﾃﾊﾞｼ	10.0	1	3.3	ＲＣ橋	不明			○					○			Ⅱ		
210	6023	三ツ羽口橋	ﾐﾂﾊﾞｸﾞﾁﾊﾞｼ	9.0	1	3.6	ＲＣ橋	不明				○					○		Ⅱ		
211	6024	二子橋	ﾌﾀｺﾞﾊﾞｼ	6.0	1	3.4	ＲＣ橋	不明				○					○		Ⅱ		
212	6025	柿の木橋	ｶｷﾉｷﾊﾞｼ	3.0	1	7.1	ＲＣ橋	不明				○					○		Ⅱ		
213	6026	北又第1号橋	ｷﾀﾏﾀﾀﾞｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ	5.0	1	19.0	ＲＣ橋	不明				○					○		Ⅱ		
214	6027	大久保谷橋	ｵｵｸﾎﾞﾀﾞﾆﾊﾞｼ	7.0	1	3.0	ＲＣ橋	不明				○					○		Ⅱ		
215	6029	別当橋	ﾍﾞｯﾄｳﾊﾞｼ	10.0	1	2.9	ＲＣ橋	1967				○					○		Ⅱ		
216	6030	神ノ川橋	ｺｳﾉｶﾞﾜﾊﾞｼ	15.0	1	6.2	ＰＣ橋	2017			○					○			Ⅰ		
217	6031	前通り橋	ﾏｴﾄﾞｵﾘﾊﾞｼ	7.0	1	3.0	ＲＣ橋	1979				○					○		Ⅱ		
218	6032	鎌倉橋	ｶﾏｸﾗﾊﾞｼ	12.0	1	3.0	ＲＣ橋	1968			●	○					○		Ⅱ		
219	6033	志礼橋	ｼﾚｲﾊﾞｼ	10.0	1	3.8	ＲＣ橋	不明				○					○		Ⅱ		
220	6034	伏兎野橋	ﾌﾄﾞﾉﾊﾞｼ	11.0	1	3.1	鋼溶接橋	不明				○					○		Ⅱ		
221	6035	下広野橋	ｼﾓﾋﾛﾉﾊﾞｼ	4.0	1	3.4	ＲＣ橋	不明				○					○		Ⅱ		
222	6036	鶴の湯橋	ﾂﾙﾉﾕﾊﾞｼ	11.0	1	5.1	ＲＣ橋	1959			●	○					○		Ⅰ		
223	6502	閉谷2号線橋	ﾄﾝｼﾞｬﾆｺﾞｳｾﾝﾊﾞｼ	3.0	1	6.0	ＲＣ橋	不明			○					○			Ⅱ		
224	6503	形部橋	ｷﾞｮｳﾌﾞﾊﾞｼ	15.0	1	6.1	ＲＣ橋	1997				○					○		Ⅰ		
225	6504	下形部橋	ｼﾓｷﾞｮｳﾌﾞﾊﾞｼ	7.0	1	6.2	ＲＣ橋	不明				○					○		Ⅱ		
226	6505	桜川橋	ｻｸﾗｶﾞﾜﾊﾞｼ	11.0	1	5.0	ＲＣ橋	1989			○					○	●		Ⅱ	断面修復	10.8
227	6506	上湊橋	ｳﾜﾐﾅﾄﾊﾞｼ	11.0	1	4.0	ＲＣ橋	1989			○					○			Ⅱ		
228	6508	井正免橋	ｲｼｮｳﾒﾝﾊﾞｼ	2.0	1	4.3	ＲＣ橋	不明				○					○		Ⅰ		
229	6509	井ノ谷橋	ｲﾉﾀﾆﾊﾞｼ	3.0	1	2.9	ＲＣ橋	不明				○					○		Ⅰ		
230	6510	目津1号橋	ﾒﾂﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ	2.0	1	10.0	ＲＣ橋	不明				○					○		Ⅰ		
231	6511	目津2号橋	ﾒﾂﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ	2.0	1	9.0	ＲＣ橋	不明				○					○		Ⅰ		
232	6512	目津3号橋	ﾒﾂﾞｻﾝｺﾞｳｷｮｳ	2.0	1	9.0	ＲＣ橋	不明				○					○		Ⅱ		
233	6513	千里免橋	ｾﾝﾘﾒﾝﾊﾞｼ	3.0	1	5.9	ＲＣ橋	不明		○					○				Ⅱ		
234	6514	目津4号橋	ﾒﾂﾞﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ	4.0	1	22.7	ＰＣ橋	不明				○					○		Ⅱ		
235	6515	出合い橋	ﾃﾞｱｲﾊﾞｼ	15.0	1	6.1	ＲＣ橋	1997				○					○		Ⅰ		

みなべ町　個別施設計画

判定区分　Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階

NO	管理番号	橋梁名	フリガナ	橋長(m)	径間数	全幅員(m)	橋梁の種類	架設年次(西暦)	修繕・点検・架替計画　(★:架替、○：定期点検、●：修繕工事、◆：撤去)										橋梁毎の判定区分	措置の主内容	修繕費(百万円)
									R02(2020)	R03(2021)	R04(2022)	R05(2023)	R06(2024)	R07(2025)	R08(2026)	R09(2027)	R10(2028)	R11(2029)			
236	6516	平成橋	ﾍｲｾｲﾊﾞｼ	8.0	1	4.0	ＲＣ橋	1989			○					○			Ⅱ		
237	7001	穴渕橋	ｱﾅﾌﾞﾁﾊﾞｼ	12.0	1	5.9	ＲＣ橋	1982				○					○		Ⅱ		
238	7002	幸先橋	ｺｳｻｷﾊﾞｼ	8.0	1	4.0	ＲＣ橋	1961			●	○					○		Ⅱ		
239	7003	堂前橋	ﾄﾞｳﾏｴﾊﾞｼ	12.0	1	4.9	ＲＣ橋	1984				○					○		Ⅱ		
240	7004	名古佐橋	ﾅｺﾞｻﾊﾞｼ	9.0	1	3.5	ＲＣ橋	不明				○					○		Ⅱ		
241	7005	上ボク橋	ｶﾐﾎﾞｸﾊﾞｼ	10.0	1	3.4	ＲＣ橋	不明				○					○		Ⅱ		
242	7006	旧屋敷橋	ｷｭｳﾔｼｷﾊﾞｼ	10.0	1	3.4	ＲＣ橋	不明				○					○		Ⅱ		
243	7008	上後垣内2号橋	ｶﾐｳｼﾛｶﾞｲﾄﾆｺﾞｳｷｮｳ	7.0	2	2.9	ＲＣ橋	不明				○					○		Ⅱ		
244	7009	上後垣内1号橋	ｶﾐｳｼﾛｶﾞｲﾄｲﾁｺﾞｳｷｮｳ	6.0	1	3.6	ＲＣ橋	不明				○					○		Ⅰ		
245	7010	山川橋	ﾔﾏｶﾜﾊﾞｼ	13.0	1	4.6	ＲＣ橋	不明			●	○					○		Ⅱ		
246	7011	柳ヶ瀬橋	ﾔﾅｶﾞｾﾊﾞｼ	13.0	1	3.6	ＲＣ橋	1972			●	○					○		Ⅱ		
247	7012	扇谷橋	ｵｳｷﾞﾀﾞﾆﾊﾞｼ	6.0	1	2.2	ＲＣ橋	不明				○					○		Ⅱ		
248	7013	西前橋	ﾆｼﾏｴﾊﾞｼ	12.0	1	2.3	鋼溶接橋	不明				○					○		Ⅱ		
249	7014	小橋谷橋	ｺﾊﾞｼﾀﾞﾆﾊﾞｼ	6.0	1	2.8	ＲＣ橋	不明				○					○		Ⅱ		
250	7015	広瀬橋	ﾋﾛｾﾊﾞｼ	11.0	1	3.0	ＲＣ橋	不明				○					○		Ⅱ		
251	7016	岡崎橋	ｵｶｻﾞｷﾊﾞｼ	6.0	1	2.8	ＲＣ橋	不明				○					○		Ⅱ		
252	7017	面谷橋	ｵﾓﾀﾞﾆﾊﾞｼ	5.0	1	3.5	ＲＣ橋	不明				○					○		Ⅱ		
253	7018	森ノ谷橋	ﾓﾘﾉﾀﾆﾊﾞｼ	5.0	1	3.4	ＲＣ橋	不明				○					○		Ⅰ		
254	7020	休場橋	ﾔｽﾊﾞﾊﾞｼ	10.0	1	3.7	鋼溶接橋	不明				○					○		Ⅱ		
255	7021	中用橋	ﾁｭｳﾖｳﾊﾞｼ	9.0	2	3.5	鋼溶接橋	不明			●	○					○		Ⅰ		
256	7023	白木尾1号橋	ｼﾗｷｵｲﾁｺﾞｳｷｮｳ	4.0	1	2.4	ＲＣ橋	不明				○					○		Ⅱ		
257	7024	白木尾2号橋	ｼﾗｷｵﾆｺﾞｳｷｮｳ	7.0	1	2.4	ＲＣ橋	不明				○					○		Ⅱ		
258	7025	白木尾3号橋	ｼﾗｷｵｻﾝｺﾞｳｷｮｳ	6.0	1	2.4	ＲＣ橋	不明				○					○		Ⅰ		
259	7026	白木尾4号橋	ｼﾗｷｵﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ	14.0	3	2.4	ＲＣ橋	不明				○					○		Ⅰ		
260	7027	北樫平橋	ｷﾀｶｼﾀﾞｲﾗﾊﾞｼ	11.0	1	3.0	ＲＣ橋	不明				○					○		Ⅱ		
261	7028	梶田橋	ｶｼﾞﾀﾊﾞｼ	4.0	1	3.4	ＲＣ橋	不明			●	○					○		Ⅱ		
262	7029	平谷橋	ﾀｲﾗﾀﾞﾆﾊﾞｼ	6.0	1	3.7	ＲＣ橋	不明				○					○		Ⅱ		
263	7030	丈ノ谷橋	ｼﾞｮｳﾉﾀﾆﾊﾞｼ	5.0	1	4.0	ＲＣ橋	不明				○					○		Ⅱ		
264	7031	新屋橋	ｼﾝﾔﾊﾞｼ	12.0	1	4.7	ＲＣ橋	不明				○					○		Ⅱ		
265	7032	孫次郎橋	ﾏｺﾞｼﾞﾛｳﾊﾞｼ	8.0	1	3.0	ＲＣ橋	不明				○					○		Ⅱ		
266	7033	第２出合橋	ﾀﾞｲﾆﾃﾞｱｲﾊﾞｼ	11.0	1	7.2	ＲＣ橋	不明		○					○				Ⅱ		
267	7034	小田橋	ｺﾀﾞﾊﾞｼ	12.0	1	2.5	ＲＣ橋	不明				○					○		Ⅱ		
268	7035	久世谷橋	ｸｾﾀﾞﾆﾊﾞｼ	10.0	1	4.1	ＲＣ橋	1962				○					○		Ⅱ		
269	7036	地の平橋	ﾁﾞﾉﾀﾞｲﾗﾊﾞｼ	8.0	1	2.9	ＲＣ橋	不明				○					○		Ⅰ		
270	7037	笹ノ谷橋	ｻｻﾉﾀﾆﾊﾞｼ	12.0	1	4.1	ＲＣ橋	不明				○					○		Ⅱ		
271	7038	登尾橋	ﾉﾎﾞﾘｵﾊﾞｼ	8.0	1	2.8	ＲＣ橋	不明				○					○		Ⅰ		
272	7039	山崎橋	ﾔﾏｻｷﾊﾞｼ	13.0	1	3.5	ＲＣ橋	不明				○					○		Ⅱ		
273	7040	臼ノ谷橋	ｳｽﾉﾀﾆﾊﾞｼ	6.0	1	4.1	ＲＣ橋	1963				○					○		Ⅱ		
274	7041	横谷橋	ﾖｺﾀﾞﾆﾊﾞｼ	7.0	1	4.7	ＲＣ橋	不明				○					○		Ⅱ		
275	7042	下北谷橋	ｼﾓｷﾀﾀﾞﾆﾊﾞｼ	8.0	1	2.5	ＲＣ橋	不明			○					○			Ⅰ		
276	7043	寺坂橋	ﾃﾗｻｶﾊﾞｼ	4.0	1	8.5	ＲＣ橋	不明				○					○		Ⅱ		
277	7044	古田橋	ﾌﾙﾀﾊﾞｼ	12.0	1	4.1	ＲＣ橋	1963				○					○		Ⅱ		
278	7045	奈良谷橋	ﾅﾗﾀﾞﾆﾊﾞｼ	4.0	1	4.4	ＲＣ橋	不明				○					○		Ⅱ		
279	7046	井戸ヶ谷橋	ｲﾄﾞｶﾞﾀﾆﾊﾞｼ	3.0	1	3.8	ＲＣ橋	不明				○					○		Ⅱ		
280	7047	楠ノ本橋	ｸｽﾉﾓﾄﾊﾞｼ	2.0	1	10.7	ＲＣ橋	不明			○					○			Ⅱ		
281	7048	出合橋	ﾃﾞｱｲﾊﾞｼ	12.0	1	7.2	ＰＣ橋	1988				○					○		Ⅱ		
282	7049	神子垣内橋	ﾐｺｶﾞｲﾄﾊﾞｼ	11.0	1	5.2	ＰＣ橋	1999			○					○			Ⅱ		

みなべ町　個別施設計画

判定区分　Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階　Ⅲ：早期措置段階　Ⅳ：緊急措置段階

NO	管理番号	橋梁名	フリガナ	橋長(m)	径間数	全幅員(m)	橋梁の種類	架設年次(西暦)	修繕・点検・架替計画　(★:架替、○：定期点検、●：修繕工事、◆：撤去) R02(2020)	R03(2021)	R04(2022)	R05(2023)	R06(2024)	R07(2025)	R08(2026)	R09(2027)	R10(2028)	R11(2029)	橋梁毎の判定区分	措置の主内容	修繕費(百万円)
283	7050	向流ル橋	ﾑｶｲﾅｶﾞﾙﾊﾞｼ	3.0	1	8.7	ＲＣ橋	不明				○					○		Ⅰ		
284	7501	松ノ地橋	ﾏﾂﾉﾁﾞﾊﾞｼ	8.0	1	3.5	鋼溶接橋	不明				○			●		○		Ⅲ	塗替塗装 断面修復	10.0
285	7502	久木橋	ﾋｻｷﾞﾊﾞｼ	8.0	1	3.5	ＲＣ橋	不明				○					○		Ⅱ		
286	7504	広畑橋	ﾋﾛﾊﾞﾀｹﾊﾞｼ	11.0	1	4.2	ＲＣ橋	不明				○	●				○		Ⅰ		
287	7505	汐ヶ谷橋	ｼｵﾝﾀﾆﾊﾞｼ	12.0	1	6.0	ＲＣ橋	不明				○					○		Ⅰ		
288	7506	稲谷橋	ｲﾅﾀﾞﾆﾊﾞｼ	2.0	1	9.0	ＲＣ橋	不明				○					○		Ⅰ		
289	7507	中根橋	ﾅｶﾈﾊﾞｼ	15.0	1	3.9	ＲＣ橋	1972		○					○				Ⅱ		
290	7508	地主橋	ﾁﾞﾇｼﾊﾞｼ	9.0	1	3.5	ＲＣ橋	不明				○					○		Ⅱ		
291	7510	橋本橋	ﾊｼﾓﾄﾊﾞｼ	11.0	1	5.0	ＲＣ橋	1974				○					○		Ⅱ		
292	7511	浜1号橋	ﾊﾏｲﾁｺﾞｳｷｮｳ	3.0	1	4.3	(ＲＣ橋)	不明					◆							撤去	
293	7512	浜2号橋	ﾊﾏﾆｺﾞｳｷｮｳ	2.0	1	4.4	(ＲＣ橋)	不明					◆							撤去	
294	7513	葛原橋	ｶﾂﾊﾗﾊﾞｼ	13.0	1	3.1	ＲＣ橋	不明				○					○		Ⅱ		
295	7515	伏山橋	ﾌｾﾔﾏﾊﾞｼ	11.0	1	3.0	ＲＣ橋	不明	○	●				○					Ⅱ		
296	7517	石ヶ坪橋	ｲｼｶﾞﾂﾎﾞﾊﾞｼ	2.0	1	7.0	ＲＣ橋	不明				○					○		Ⅱ		
297	7518	池ノ谷橋	ｲｹﾉﾀﾆﾊﾞｼ	3.0	1	9.0	ＲＣ橋	不明				○					○		Ⅱ		
298	7521	丸山橋	ﾏﾙﾔﾏﾊﾞｼ	13.0	1	4.0	ＲＣ橋	1954				○					○		Ⅰ		
299	7523	尾葉奈橋	ｵﾊﾞﾅﾊﾞｼ	13.0	1	6.0	ＲＣ橋	1962				○					○		Ⅰ		
300	7525	旧木下橋	ｷｭｳｷﾉｼﾀﾊﾞｼ	9.0	1	6.4	(ＲＣ橋)	1926					◆							撤去	
301	7526	深山橋	ﾌｶﾔﾏﾊﾞｼ	13.0	1	6.2	ＲＣ橋	1998				○					○		Ⅰ		
302	7527	狼烟尾橋	ﾉﾛｼｵﾊﾞｼ	3.0	1	7.6	ＲＣ橋	不明				○					○		Ⅱ		
303	7528	下久保橋	ｼﾓｸﾎﾞﾊﾞｼ	11.0	1	3.6	鋼溶接橋	不明				○					○		Ⅱ		
304	7529	中阿津橋	ﾅｶｱﾂﾞﾊﾞｼ	2.0	1	9.6	ＲＣ橋	不明				○					○		Ⅱ		
305	7530	ビシャコ橋	ﾋﾞｼｬｺﾊﾞｼ	2.0	1	8.4	ＲＣ橋	不明	○					○					Ⅱ		
306	7531	地蔵橋	ｼﾞｿﾞｳﾊﾞｼ	6.0	1	10.7	ＲＣ橋	1988				○					○		Ⅱ		
307	7532	上辺橋	ｶﾐﾍﾞﾊﾞｼ	10.0	1	9.8	ＲＣ橋	1970			●	○					○		Ⅰ		
308	7533	井ノ上橋	ｲﾉｳｴﾊﾞｼ	13.0	1	7.5	ＰＣ橋	2006		○					○				Ⅱ		
309	7534	政井谷2号橋	ﾏｻｲﾀﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ	41.0	3	5.0	ＰＣ橋	2000		○					○				Ⅰ		
310	7535	沼田ケ原橋	ﾇﾀｶﾞﾜﾗﾊﾞｼ	20.0	1	6.5	ＰＣ橋	2009					○					○	Ⅰ		
311	7537	洞橋	ﾎﾗﾊﾞｼ	6.0	1	5.0	ＰＣ橋	不明					○					○	Ⅰ		
312	7538	下はげ橋	ｼﾓﾊｹﾞﾊﾞｼ	5.0	1	5.0	ＲＣ橋	不明					○					○	Ⅱ		
313	7539	高原田橋	ﾀｶﾊﾗﾀﾞﾊﾞｼ	14.0	1	5.0	ＲＣ橋	2012					○					○	Ⅱ		
314	4448	芝橋	ｼﾊﾞﾊﾞｼ	16.0	2	4.2	ＲＣ橋	1961					○					○	Ⅱ		
315	7540	新寒者橋	ｼﾝｶﾝｼﾞｬﾊﾞｼ	23.0	1	7.0	ＰＣ橋	2021							○						
316	7541	地ノ平橋	ｼﾞﾉﾀﾞｲﾗﾊﾞｼ	22.0	1	6.3	ＰＣ橋	2023							○						

項目＼年度	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
年度別点検数	62	70	70	82	24	61	72	70	82	24
年度別修繕数	6	4	8	1	2	2	3	1	8	5
年度別更新数										
年度別撤去数	0	2	1	3	0	1	0	0	0	0
橋梁総数	313	311	310	307	308	307	309	309	309	309
